



今後の須賀小学校地域拠点施設整備スケジュール

【STEP1】校舎先行解体工事中  
(令和8年7月～12月末)

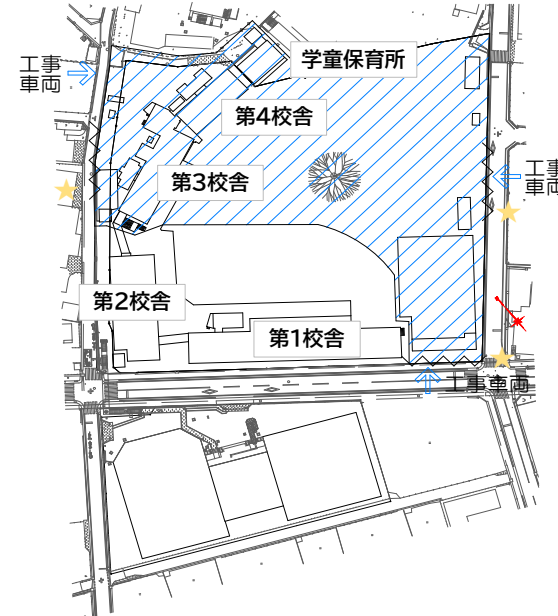


第1・2校舎を既存利用しながら、第3・4校舎及び学童保育所、プールを解体する。

【STEP2】校舎・体育館棟建設工事中  
(令和8年10月～令和10年2月末)

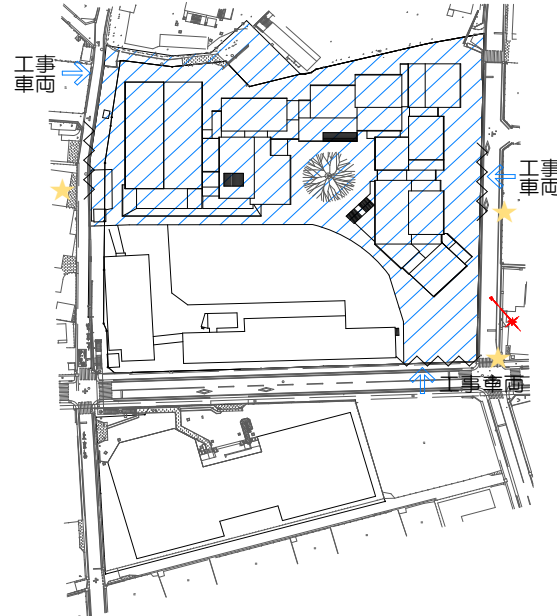


第3・4校舎及び学童保育所、プールの解体後、新施設を建設する。

【STEP3】校舎と既存体育館解体改修工事中  
(令和10年5月～9月末)

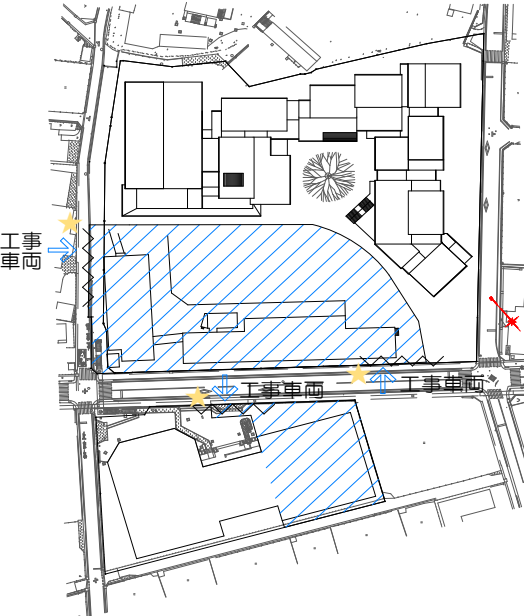

新施設への引越し後、既存の第1・2校舎を解体する。  
既存小学校体育館も解体し改修工事を行う。

【STEP4】外構工事  
(令和10年8月～令和10年12月末)

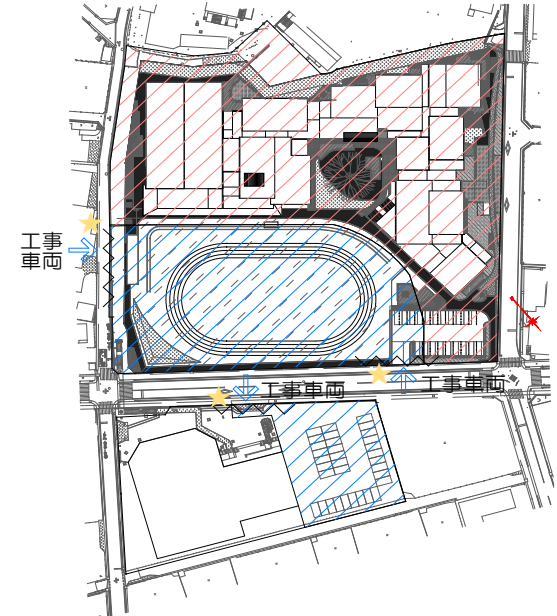

校庭及び体育館跡地の整備を行う。

| STEP 1 先行<br>解体工事               |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | STEP 2 校舎・体育館棟建設工事 |         |    |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | STEP 3 校舎と既存<br>体育館解体改修工事 |                  |  |  |  |  | STEP 4 外構工事 |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--------------------|---------|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---------------------------|------------------|--|--|--|--|-------------|------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
|                                 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 第1・2校舎のみで学校運用開始    |         |    |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|                                 | 令和7年 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    | 令和8年    |    |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 令和9年 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           | 令和10年            |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|                                 | 1月   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月                | 1月      | 2月 | 3月                    | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月                       |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 基本設計【済】                         | ●    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    |         |    |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 実施設計                            |      |    | ●  |    |    |    |    |    |    |     |     |                    |         |    |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 校舎先行解体工事                        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    | 入札・契約手  |    | 学童保育所とプール、第3・4校舎を先行解体 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|                                 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    |         |    | 工期 5 か月               |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 校舎・体育館棟<br>建設工事                 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    |         |    | 入札・契約手続               |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|                                 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    |         |    | 工期 17 か月              |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 【変更】校舎先行解体及<br>び校舎・体育館棟建設工<br>事 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    | 入札・契約手続 |    | 学童保育所とプール、第3・4校舎を先行解体 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           | 令和10年4月<br>開校・開館 |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|                                 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    |         |    | 工期 5 か月               |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|                                 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    |         |    | 工期 17 か月              |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 資材調達（参考）                        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    | 入札・契約   |    | 工事に必要な木材を調達し、都度現場に搬入  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 【変更】資材調達<br>（参考）                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    | 入札・契約手続 |    | 工事に必要な木材を調達し、都度現場に搬入  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 校舎(第1・2校舎)と既存<br>体育館解体改修工事      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    |         |    |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           | 入札・契約手続          |  |  |  |  |             | 第1・2校舎と小学校体育館の解体 |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|                                 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    |         |    |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             | 工期 5 か月          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 外構工事                            |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                    |         |    |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                           |                  |  |  |  |  |             |                  |  |  |  |  |  | 第1・2校舎と小学校体育館跡地の外構整備 |  |  |  |  |  |

現段階の変更案であり、今後予定が変わる可能性があります。

交付金内定（予定）
