


今後の須賀小学校地域拠点施設整備スケジュール


工事エリア
工事完了エリア

【STEP1】校舎先行解体工事中
(令和8年5月～9月末)

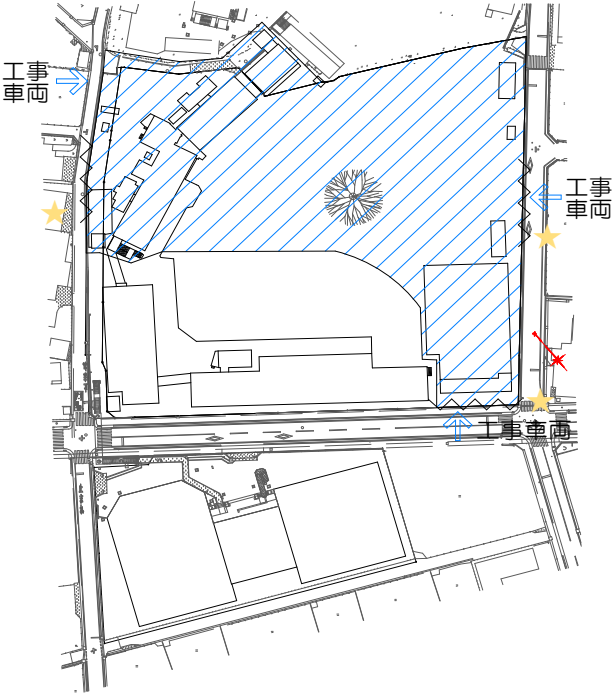


第1・2校舎を既存利用しながら、第3・4校舎及び学童保育所、プールを解体する。

【STEP2】校舎・体育館棟建設工事中
(令和8年10月～令和10年2月末)

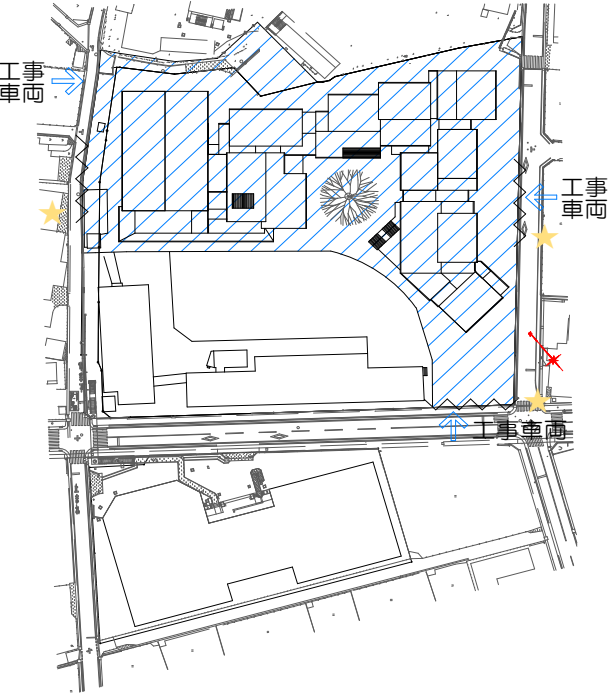


第3・4校舎及び学童保育所、プールの解体後、新施設を建設する。

【STEP3】校舎と既存体育館解体改修工事中
(令和10年5月～9月末)

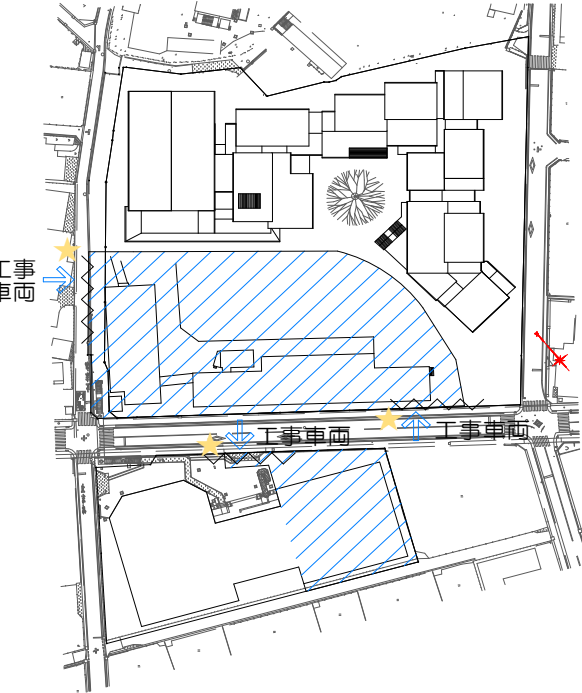

新施設への引越し後、既存の第1・2校舎を解体する。
既存小学校体育館も解体し改修工事を行う。

【STEP4】外構工事
(令和10年8月～令和10年12月末)

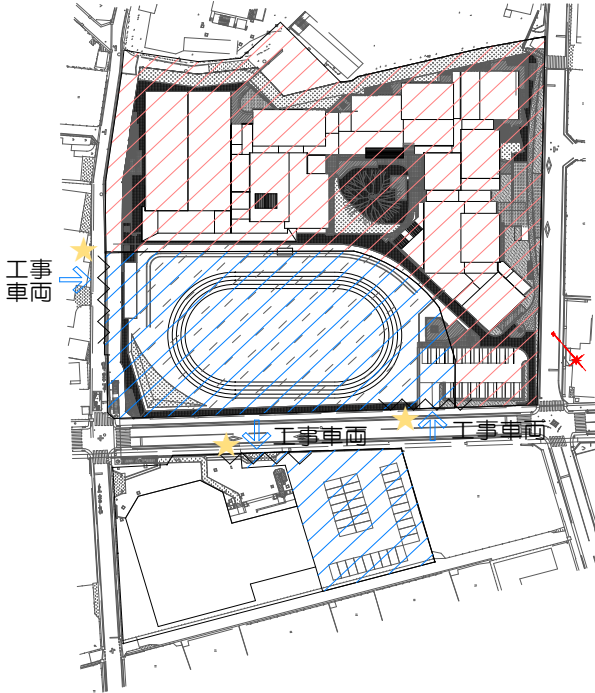

校庭及び体育館跡地の整備を行う。

