

須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について

令和7年8月21日(木)

教育推進課・地域支援課

くらし安全課・子育て支援課

1 実施設計に向けた取組

- 6月9日・10日 須賀小学校教職員ヒアリングの実施（諸室の設え）
- 6月23日 須賀小学校教職員ワークショップの実施
（普通教室について）
- 7月1日 かえで児童クラブ職員ヒアリングの実施（諸室の設え）
- 7月1日 須賀小学校地域拠点施設整備推進委員会の開催
- 7月22日 須賀小学校教職員ワークショップの実施
（メディアセンターの使い方について）

2 工事実施に向けた教室等の移転

令和8年5月から第3校舎、第4校舎及びかえで第一児童クラブ棟の先行解体工事が始まる予定です。これに伴い、第3校舎、第4校舎にある小学校施設（教室、職員室、理科室及び音楽室等）は第1校舎・第2校舎に移転し、第1校舎及びかえで第一児童クラブ棟にある学童保育所は須賀中学校に一時移転します。移転期間は新施設が完成する令和10年3月までの予定です。**※裏面参照**

学童保育所の移転に伴う教室改装工事等の費用については、9月議会において補正予算として計上いたします。

3 今後のスケジュール

（1）令和7年度 実施設計（～12月）

- ・ 須賀小学校地域拠点施設整備推進委員会の開催
- ・ 須賀小学校児童ヒアリングの実施
- ・ 学童保育所ヒアリングの実施
- ・ 地域コミュニティ施設運営の検討
- ・ 工事実施に向けた教室等の移転
- ・ 「第3・4校舎及び榎の木お別れ会」に向けた準備
（令和8年4月実施予定）


（2）令和8年度 解体・建築工事

（3）令和9年度 建築工事

（4）令和10年度 開設

工事実施に向けた教室等の移転

- ・第3校舎・第4校舎にある学校機能⇒第1校舎・第2校舎へ移転
- ・児童保育所機能⇒須賀中学校1階の美術室、金工室へ移転
- ・須賀中学校美術室⇒2階パソコン教室へ移転
- ・須賀中学校金工室⇒隣接する1階木工室へ集約
- ・児童保育専用のトイレ・出入口等の改装

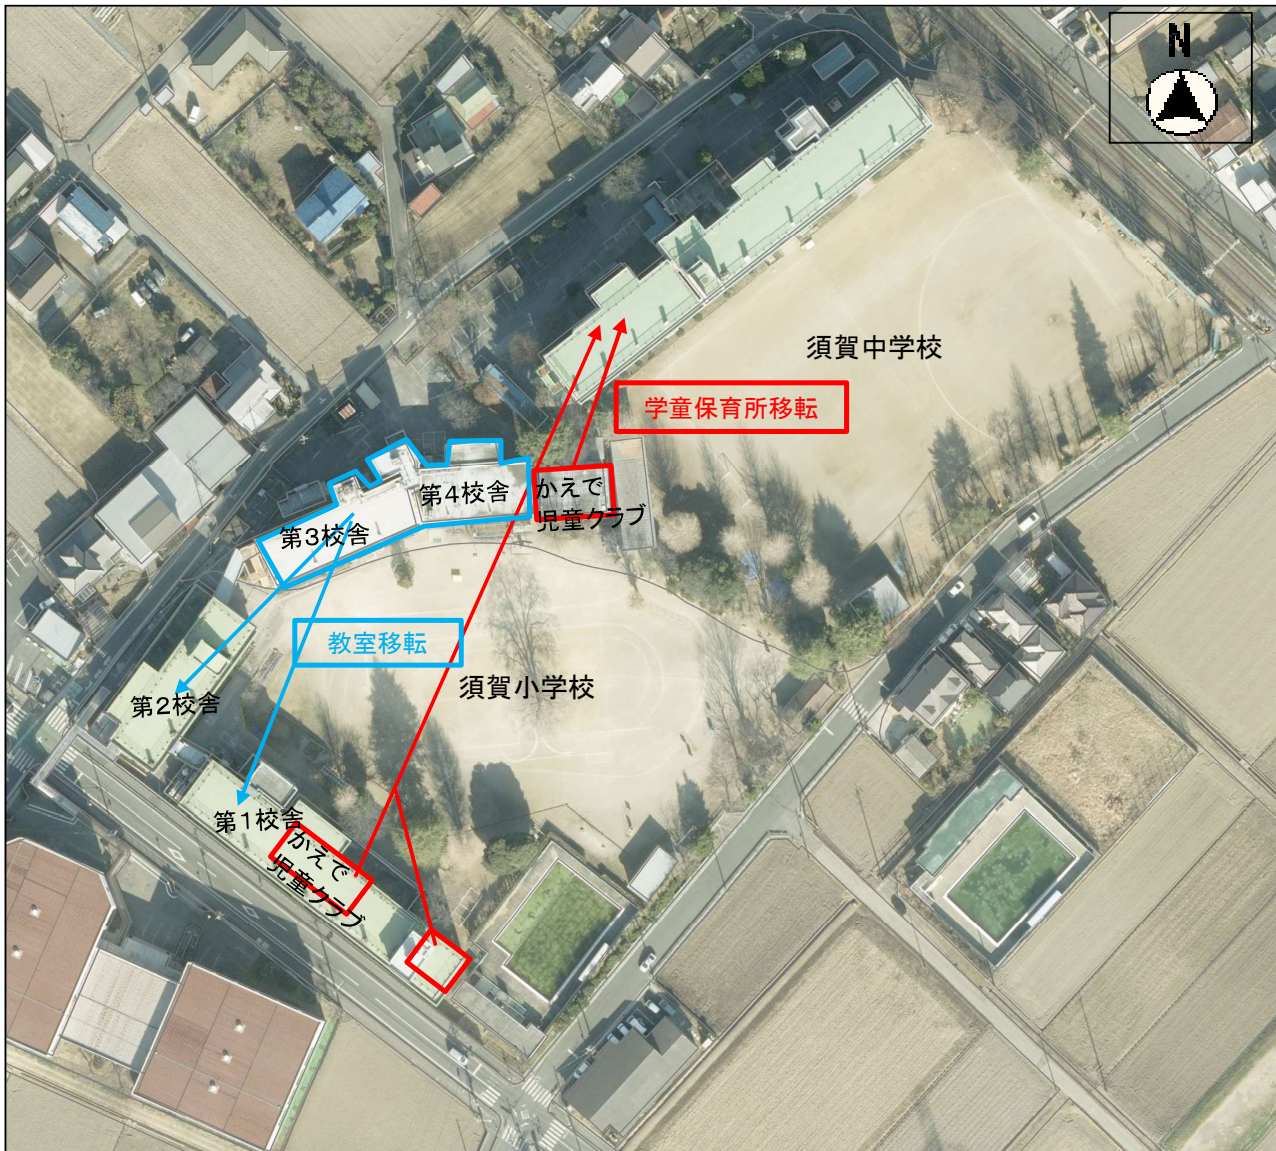

・教室、学童保育所移転スケジュール(令和7年度)

[illegible]
